



ORDEM DE SERVIÇO

Referente à contratação de empresa legalmente habilitada, através de execução indireta, aplicando-se lhe, supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e Disposições de Direito Privado, à prestação de serviços de engenharia para **Execução de Pintura do Prédio da Merenda Escolar do Município da Aliança - PE**, localizado na sede do município de Aliança – PE, conforme objeto de contrato de Obra Pública.

REFERÊNCIA:

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022

CONTRATO Nº 018/2022

Valor do Contrato: R\$ 27.973,49 (vinte e setemil, novecentos e setenta e três reais e quarenta e nove centavos)

Pela presente Ordem de Serviço, autorizamos a empresa **J R DE LIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 24.217.540/0001-90** a iniciar os serviços que menciona o contrato nº 018/2022, celebrado entre si e o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**.

Aliança – PE 08 de novembro de 2022.



Documentos assinados digitalmente
ANDERSON EDUARDO DA SILVA
Data: 08/11/2022 12:55:26-0990
Verifique em: <https://verifica.alianca.pe.br>

CONTRATANTE: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Anderson Eduardo da Silva

CONTRATADO(A): _____

J R DE LIRA CONSTRUÇÕES EIRELI

José Roberto de Lira

1ª MEDIÇÃO

OBRA: PINTURA DO PREDIO DA MERENDA ESCOLAR
LOCAL: ALIANÇA - PE
EMPRESA CONTRATADA: J R DE LIRA CONSTRUÇÕES EIRELI
RESP. TÉCNICO: ELTON DE SOUZA BARBOSA - CREA RNP 1819511430
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220877726

DISPENSA Nº 001/2022
VALOR DO CONTRATO: R\$ 27.973,49

ORDEN DE SERVIÇO: 08/11/2022
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS
PRAZO RESTANTE: 41 DIAS
ADITIVO DE PRAZO: 0 DIAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2022
VALOR TOTAL DO BM: R\$ 23.165,50
VALOR ACUMULADO: R\$ 23.165,50
% ACUMULADO: 82,81%
PERÍODO: 08/11/2022 A 27/12/2022
DATA DE ELABORAÇÃO: 27/12/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	VALOR UNITARIO C/IBDI	PLANILHA CONTRATADA		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO	
				QUANTIDADE	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	649,15	1,00	649,15	1,00	649,15	1,00	649,15	-	4.807,99
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	649,15	1,00	649,15	1,00	649,15	1,00	649,15	-	4.807,99
2.0	PINTURA	m²	21,77	134,73	2.933,07	133,11	2.897,80	133,11	2.897,80	1,02	35,27
2.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMAO, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 09/2021	m²	17,30	827,01	14.307,27	599,65	10.373,94	599,65	10.373,94	227,36	773,02
2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAO, AF 06/2014	m²	3,40	827,01	2.811,83	599,65	2.038,81	599,65	2.038,81	227,36	773,02
2.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO, AF 06/2014	m²	3,40	827,01	2.811,83	599,65	2.038,81	599,65	2.038,81	227,36	773,02
2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAO, AF 06/2014	m²	19,97	175,75	3.509,72	174,21	3.478,97	174,21	3.478,97	1,54	30,75
2.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO, AF 06/2014	m²	3,89	175,75	683,66	174,21	677,67	174,21	677,67	1,54	30,75
2.6	VERNIZ ACRILICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMAO, AF 06/2014	m²	13,74	134,73	1.851,19	133,11	1.828,93	133,11	1.828,93	1,62	22,26
2.7	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE FERRO, DUAS DEMAO, SEM RASPAGEM E SEM APARELHAMENTO.	m²	20,46	60,00	1.227,60	59,64	1.220,23	59,64	1.220,23	0,36	7,37
VINTE E TRÊS MIL, CENTO E SSESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS					R\$ 27.973,49	1ª MEDIÇÃO	R\$ 23.165,50	ACUMULADO	R\$ 23.165,50	SALDO	R\$ 4.807,99

PREFEITO

SECRETARIO DE OBRAS

ENGENHEIRO PREFEITURA

Armando Freitas
Sec. Adjunto de Obras
Mat.: 15008

ENGENHEIRO EMPRESA

Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Téc. - CREA 1819511430


Documento assinado digitalmente
ELTON DE SOUZA BARBOSA
Data: 06/01/2023 08:43:39-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
SECRETARIA DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS

			2,40		0,33	0,79
	Fachada Frontal		18,70		4,31	80,60
	Fachada Lateral		9,60		6,37	61,15
			21,80		3,50	76,30
	Beiral		18,70	0,80		14,96
			9,60	0,45	0,20	3,74
			9,60	0,20		4,32
			10,15	0,45		1,92
			10,15	0,60		4,57
						6,09
	Pintura Interna					
	Parede	4,00	6,70		1,22	32,70
	Pilares	2,00	0,28		0,90	0,50
			3,00		0,90	0,41
			2,00		0,90	0,18
	Vigas	2,00	3,80		0,30	2,28
			3,80	0,15		0,57
			3,70	0,15		0,56
		2,00	3,70		0,30	2,22
			4,70	0,15		0,71
		2,00	4,70		0,20	1,88
			1,80	0,15		0,27
			1,80	0,20		0,36
			1,85		0,25	0,46
			1,85	0,15		0,28
		4,00	4,60		0,30	5,52
		2,00	9,62		0,40	7,70
	Área da Escada		0,50		3,15	1,58
		2,00	2,00		3,15	12,60
			3,05		3,15	9,61
			0,60		2,45	1,47
			5,00		1,15	5,75
			3,25	1,10		3,58
			2,60	1,20		3,12
			1,10		0,25	0,28
			2,75		0,25	0,69
			2,90	0,90		2,61
			3,20	2,00		6,40
	Paredes	2,00	4,68		1,46	13,67
		4,00	9,63		1,46	56,24
		2,00	4,60		1,46	13,43
		2,00	1,85		1,33	4,92
			2,87		1,46	4,19
		2,00	5,82		2,86	33,29
		2,00	1,85		2,86	10,58
		2,00	4,10		1,31	10,74
		2,00	5,78		1,31	15,14
		2,00	4,05		2,61	21,14
		2,00	4,02		2,61	20,98
	Wc	2,00	2,05		1,36	5,58
		2,00	1,48		1,36	4,03
		2,00	1,97		0,40	1,58
		2,00	1,46		0,40	1,17
	Descontos					
	Portão lateral	-1,00	3,10		2,40	-7,44
	Porta de esteira	-2,00	3,00		0,61	-3,66
		-1,00	3,94		0,61	-2,40
		-2,00	3,00		0,89	-5,34
		-1,00	3,94		0,78	-3,07
	Janelas	-2,00	2,00		1,00	-4,00
		-2,00	0,40		0,40	-0,32
		-2,00	0,80		0,75	-1,20
	Vãos	-2,00	2,45		0,60	-2,94
		-2,00	1,55		1,22	-3,78
		-2,00	3,20		0,56	-3,58
		-2,00	2,28		0,56	-2,55
		-2,00	1,80		0,63	-2,27
	Portas	-1,00	0,60		2,10	-1,26
		-2,00	0,80		0,36	-0,58
		-2,00	0,80		0,56	-0,90
		-1,00	0,80		1,10	-0,88
					Total item 2.2	599,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
SECRETARIA DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS

2.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²				
	IGUAL ÁREA DE PINTURA EM PAREDES					
					599,65	599,65
						Total item 2.3
						599,65
2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²				
	Forro		4,10	5,78		23,70
			7,57	6,65		50,34
			1,97	1,46		2,88
			2,05	1,48		3,03
			9,62	4,65		44,73
			9,62	4,60		44,25
			2,87	1,84		5,28
						Total item 2.4
						174,21
2.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²				
	IGUAL ÁREA DE FORRO				174,21	174,21
						Total item 2.5
						174,21
2.6	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	m²				
	IGUAL ÁREA DE PINTURA DE PISO					
					133,11	133,11
						Total item 2.6
						133,11
2.7	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE FERRO, DUAS DEMÃOS, SEM RASPAGEM E SEM APARELHAMENTO.	m²				
	Porta de esteira		4,00	3,00		36,00
			2,00	3,94		23,64
						Total item 2.7
						59,64

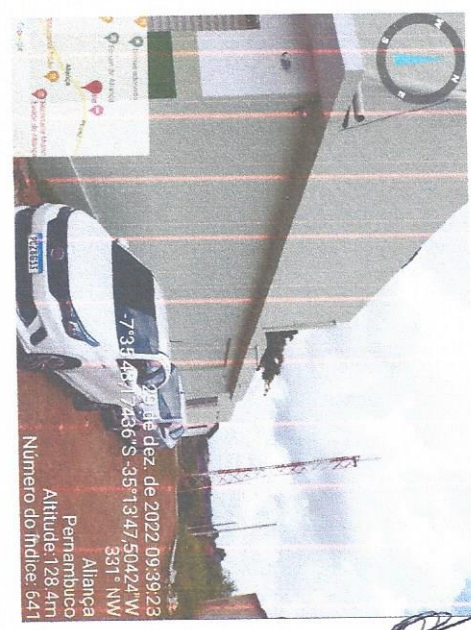
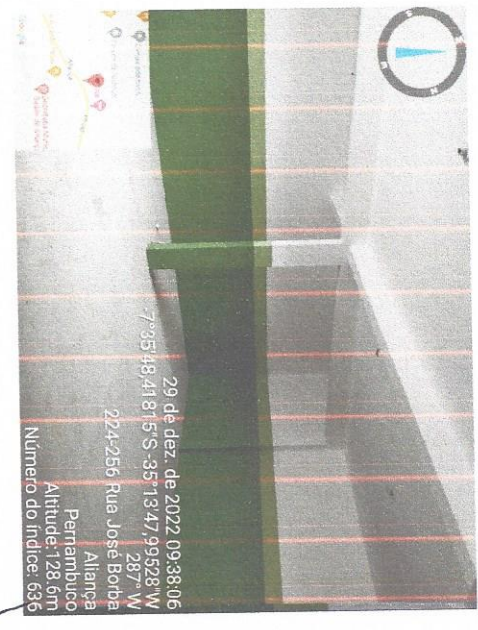
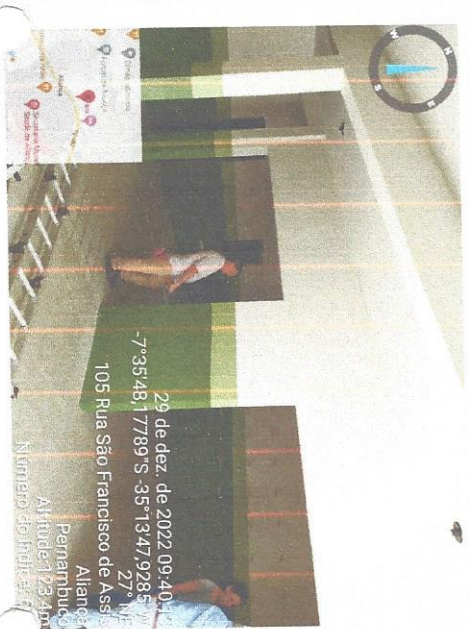
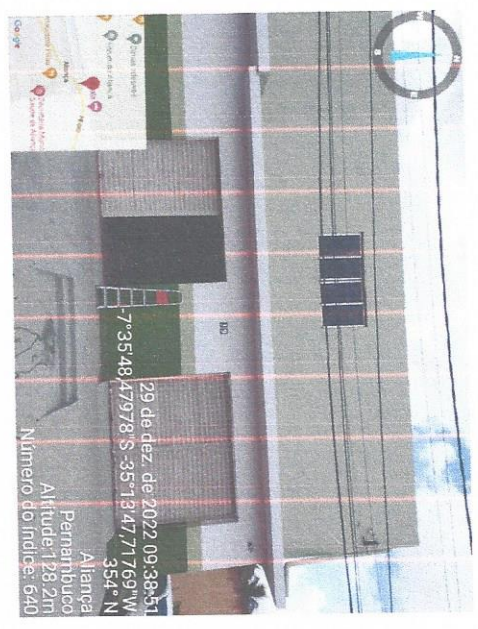

Armando Freitas
Sec. Adjunto de Obras
Mat.: 15008



Documento assinado digitalmente
ELTON DE SOUZA BARBOSA
Data: 06/01/2023 08:43:30-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Téc. - CREA 1819511430

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Armando Freitas
 Sec. Adjunto de Obras
 Mat.: 15008




TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Atestamos para os devidos fins, a conclusão da execução dos serviços referentes a pintura do prédio da Merenda Escolar do Município de Aliança – PE, em 13 de Janeiro de 2023, pela empresa J R DE LIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, CNPJ nº 24.217.540/0001-90, conforme Processo Licitatório nº 012/2022, Dispensa nº 00/2022 e Contrato 018/2022 de 01 de Novembro de 2022, constantes nos arquivos da Prefeitura Municipal de Aliança

Aliança – PE, 13 de Janeiro 2023.



Saulo Davi de Lima Silva
Engenheiro Civil/Fiscal da Obra



Oseas da Costa Lima
Secretário de Obras

Oseas da Costa Lima
Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos
Mat. 7343
